ELKEM TECHNOLOGY — SAK FOR PROSJEKTSTYRET

Dato: 12. november 2026 | Cut-off regnskap: 31.10.2026 | Saksansvarlig: Prosjektcontroller


VEDTAKSSAK: KRITISK STATUSVURDERING & STAGE-GATE 3 BESLUTNING
GreenPilot 2026 har overskredet sitt styrevedtatte baseline-budsjett (BAC 20,0 MNOK) med +189,8% i bokførte kostnader (AC: 57,97 MNOK). Samtidig utgjør uleverte leverandørforpliktelser (PO) hele 49,23 MNOK, noe som gir en samlet finansiell eksponering på **107,20 MNOK (536% av budsjett)**. Prosjektcontroller anbefaler at styret fatter vedtak om **30 dagers Technical Hold** og umiddelbar innkjøpsfrys fremfor ukontrollert videreføring.

1. Finansiell og Operasjonell Hovedstatus (EVM Status per 31.10.2026)

Metrikk	Verdi	Status	Vurdering / Avvik
Totalbudsjett (BAC)	NOK 20,00M	Baseline	Vedtatt ramme for pilotprosjektet ved Elkem Fiskå
Faktisk Påløpt Kostnad (AC)	NOK 57,97M	RØD	Kostnadsoverskridelse på +37,97 MNOK (+189,8%)
Opptjent Verdi (EV)	NOK 19,22M	RØD	96,1% fysisk ferdigstillelse; alvorlig kostnadsineffektivitet
Cost Performance Index (CPI)	0,331	RØD	For hver krone brukt skapes kun 33 øre i fysisk anleggsverdi
Schedule Performance Index (SPI)	1,056	GRØNN	Raskere fremdrift pga. forsert mekanisk montasje
Åpne Innkjøpsforpliktelser (PO)	NOK 49,23M	RØD	Uavstemte forpliktelser som aldri ble fanget opp av fakturakontr
Samlet Finansiell Eksponering	NOK 107,20M	RØD	Reell kontant- og forpliktelsesbelastning (536% av budsjett)
Balanseført AuC (IAS 38)	NOK 43,38M	VARSEL	Anlegg under utførelse; akutt IAS 36 nedskrivningsrisiko
Offentlig Tilskudd (Enova)	NOK 3,00M	Utbetalt	Transje 1 mottatt; resterende 7,0M i fare ved terminering


2. Analyse av Kostnadsutvikling og Divergens (EVM S-Kurve)

Grafen nedenfor illustrerer hvordan kostnadskontrollen glapp i Q1 2026. Fra mars 2026 skilte faktisk kostnad (AC) lag med opptjent verdi (EV).

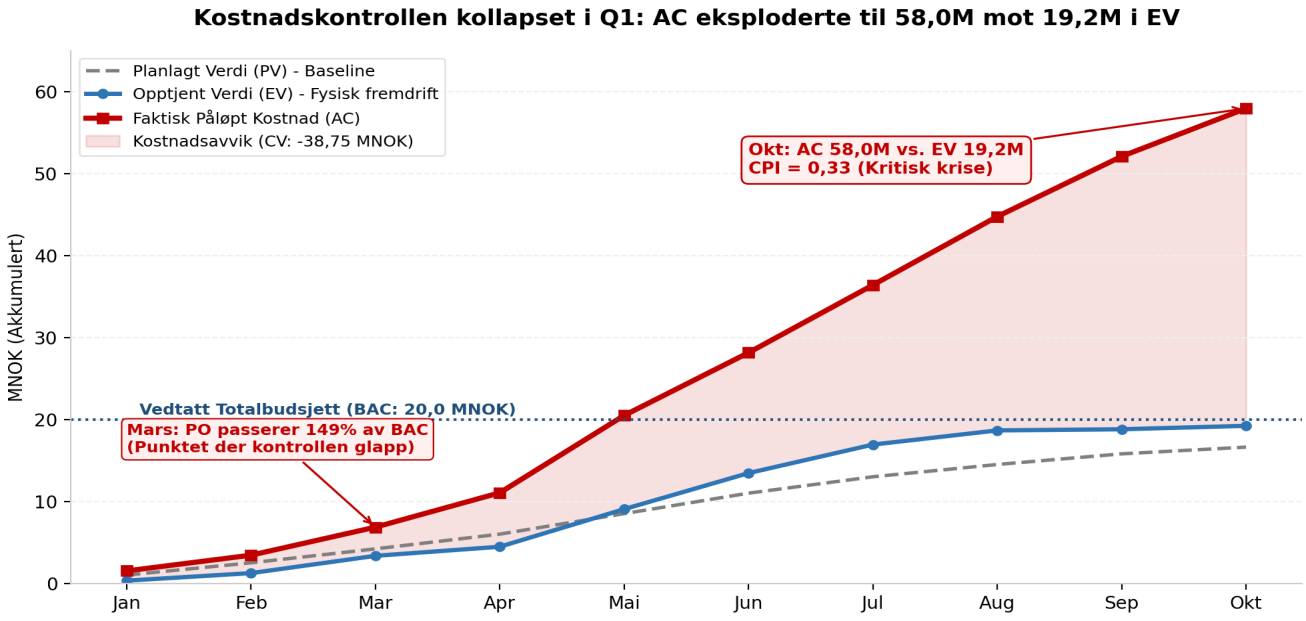


2b. Tidsbufferkonvolutt (Primavera P6 Banana Chart)

Konvolutten mellom tidlig og sen fremdriftskurve (Early vs. Late Dates) dokumenterer at fysisk fremdrift (EV) beveget seg langs den øvre kurven som følge av forsert montasje, mens påløpt kostnad (AC) sprengte buffersonen fullstendig fra mars 2026. Bufferslakk (Float) kollapset fra +22 til -14 dager.

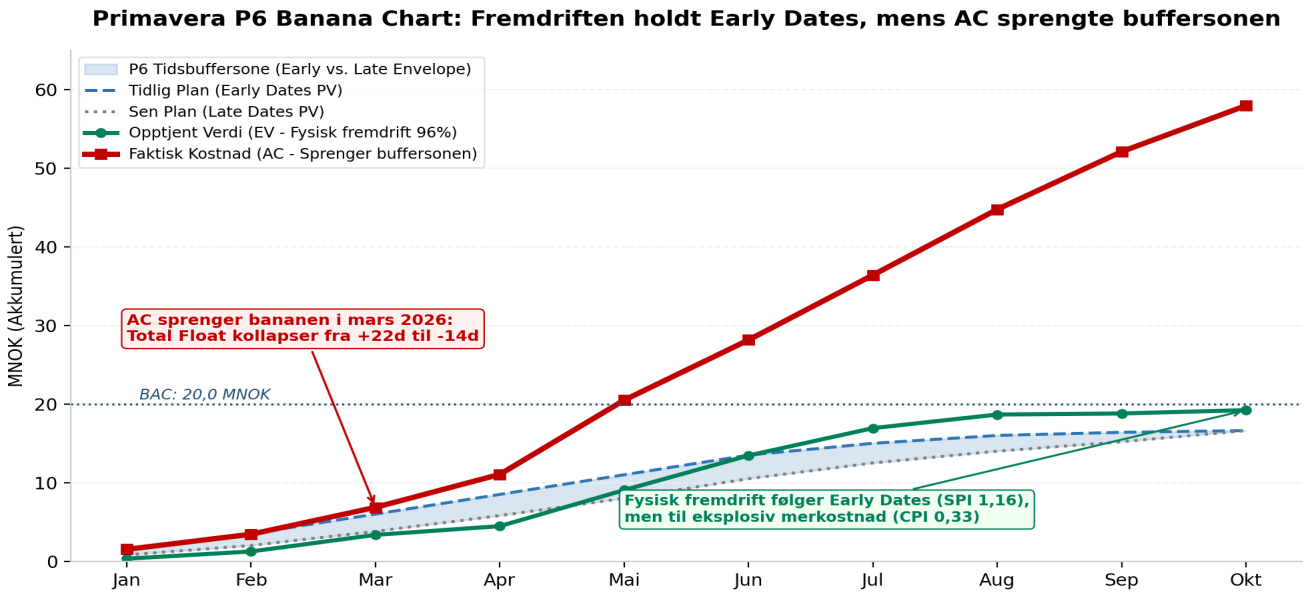


3. Forpliktelsesisberget: Påløpte Kostnader vs. Åpne Ordrer

Årsaken til at prosjektledelsen ikke slo alarm tidligere, var at rapporteringen utelukkende fokuserte på bokførte fakturaer (58M), mens 49,2M lå skjult i åpne innkjøpsordrer.

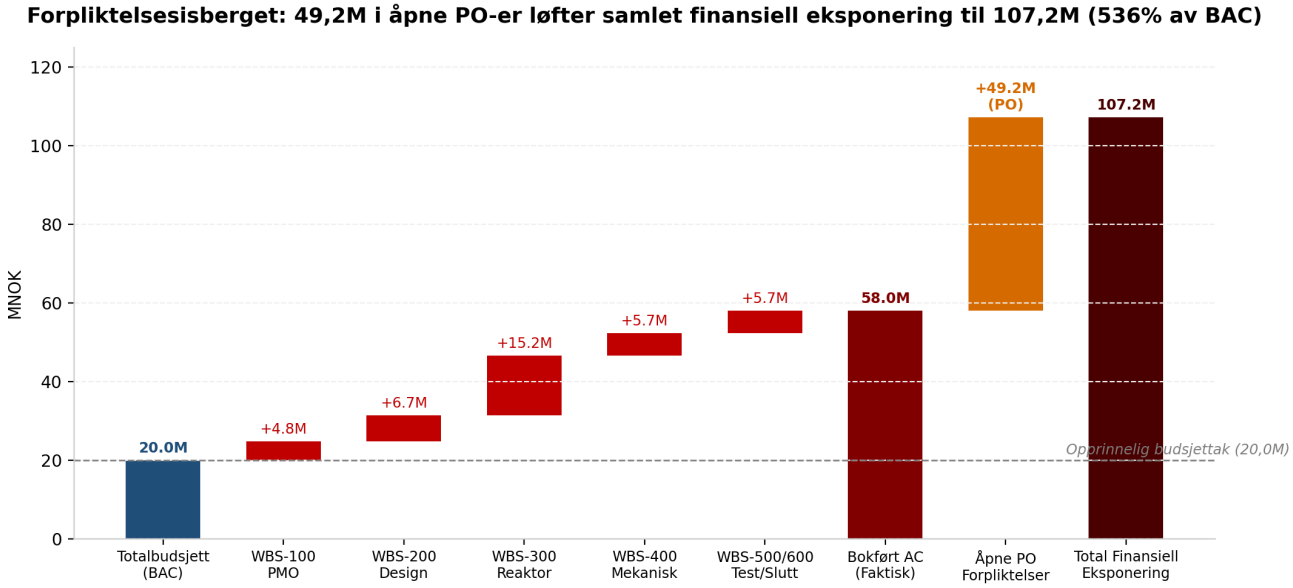



4. Likviditetsgap og Arbeidskapitalbinding (Cash Flow Bridge)

Med 30 dagers leverandørkreditt (DPO) ble kontantbelastningen skjøvet ut i tid, før den kulminerte med opptil 14,5 MNOK/mnd i september og oktober 2026.

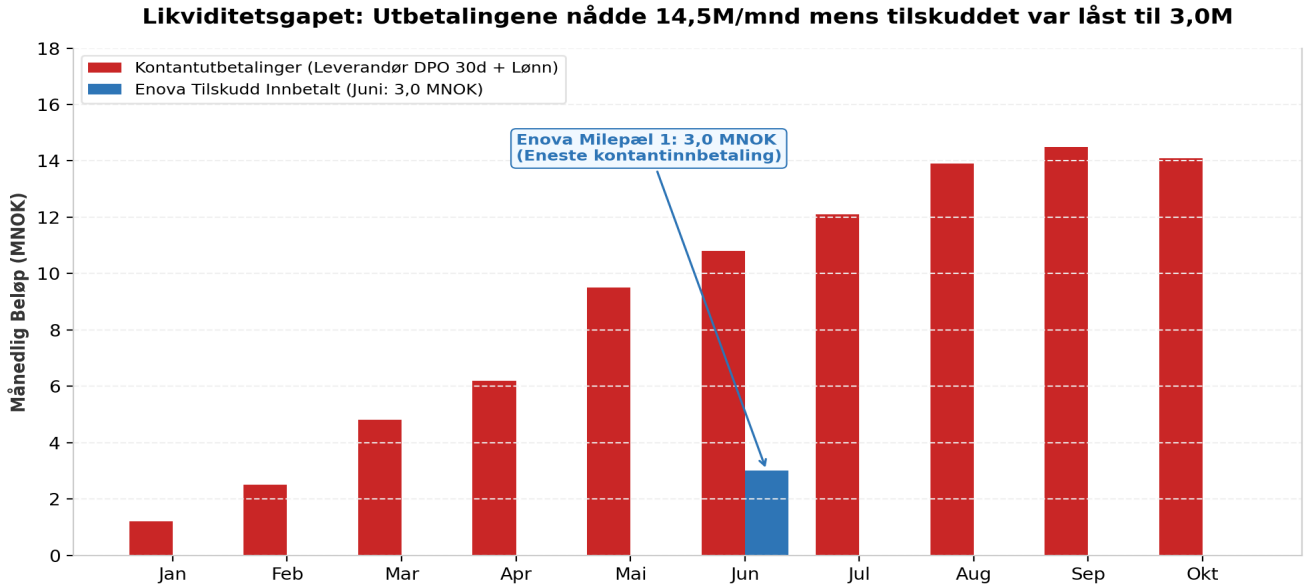

5. Enhetsbelastning på Elkem Fiskå og IFRS IAS 36 Nedskrivningsrisiko

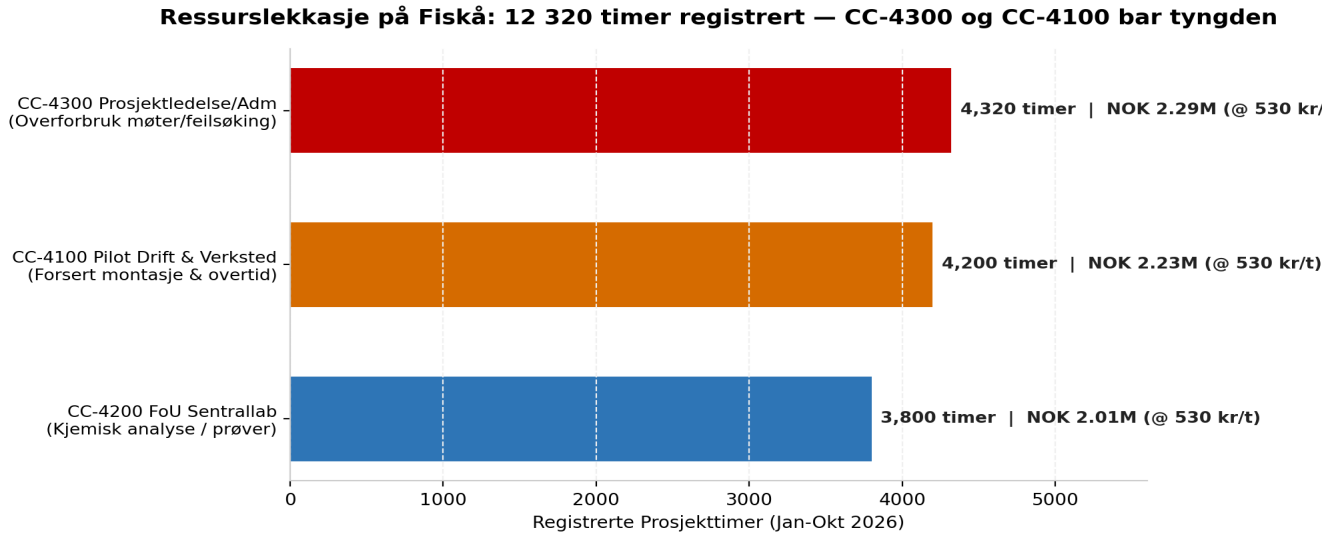

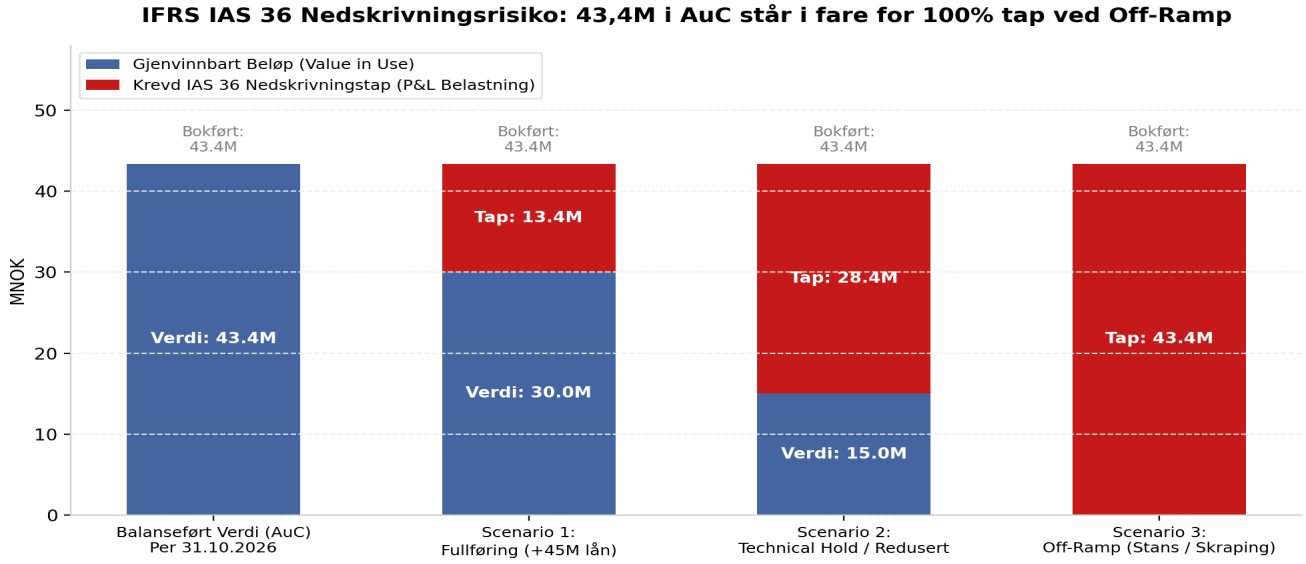

6. Controllerens Anbefaling og Vedtaksforslag

Styret inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. **Innkjøpsfrys:** Det innføres øyeblikkelig frys for alle nye innkjøpsrekvisisjoner og bestillinger knyttet til prosjekt GreenPilot 2026.
2. **Technical Hold:** Prosjektet settes i 30 dagers teknisk og finansiell pause for å gjennomføre en fullstendig kanselleringsaudit av åpne forpliktelser (49,2M).
3. **Enova-dialog:** Ledelsen gis fullmakt til å innlede samtaler med Enova for å avklare mulighetsrommet for revidert prosjektplan uten tap av tilskudd.
4. **Nedskrivningsvurdering:** Finansavdelingen utarbeider en formell IAS 36 verdifallstest for balanseført AuC (43,4M) i samråd med ekstern revisor (PwC).
